


Gメッセ群馬建設通信では、地域の皆さまに、Gメッセ群馬（群馬コンベンションセンター）建設工事の進捗状況等を定期的にお知らせします。

2月までの工事進捗状況

会議・展示施設では、約1万m²ある展示場部分の屋根鉄骨工事をを行っています。立体駐車場は鉄骨工事が完了し、床工事を進めています。



△ ① 会議・展示施設の鉄骨工事の様子

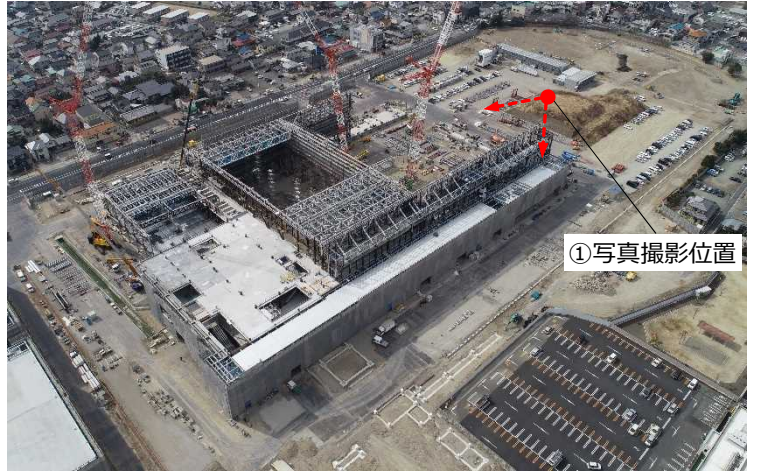

△ ② 敷地上空からの工事の様子

3月の作業予定

会議・展示施設は、引き続き、鉄骨工事と並行して床工事、外装工事を進めます。立体駐車場も床工事、外装工事を行います。

▷ 外装工事にも着手しました。
(会議・展示施設)



工程表

● … 会議・展示施設建設工事等

● … 立体駐車場建設工事

年度	H29年度		H30年度				H31年度			
	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	
準備工	●	●								
杭工事	●		●							
基礎工事		●	●							
鉄骨工事			●	●	●					
内外装工事				●	●	●	●	●	●	
外構工事		●	●	●	●	●	●	●	●	
電気設備工事		●	●	●	●	●	●	●	●	
機械設備工事			●	●	●	●	●	●	●	

▲ 現時点
