

## 農山漁村地域整備計画 事後評価調査

<b>計画の名称</b>	ぐんま水土里保全整備計画(2期)		
<b>計画策定主体</b>	群馬県		
<b>対象市町村</b>	前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、吉岡町、榛東村、甘楽町、中之条町、長野原町、東吾妻町、嬭恋村、高山村、片品村、昭和村、みなかみ町、玉村町、板倉町、千代田町、大泉町、邑楽町、栃木県足利市(計29市町村)		
<b>計画の期間</b>	平成28年度～令和元年度(4箇年)	<b>事後評価年度</b>	令和2年度
<b>計画の目標</b>	安定的な農業用水の供給(水)、農地の有効活用(土)、安全で住みやすい農村地域づくり(里)の保全整備を行い、農地や農業用水などの地域資源を将来へ引き継ぐことを目指す。		
<b>定量的指標</b>	群馬県農業農村振興計画を上位計画とした群馬県農業農村整備中期計画(ぐんま水土里保全プラン2016)で目標とする整備計画のうち、農山漁村地域整備交付金事業において実施する地区における数値を目標とする。		
	計 画	実 績	備 考
	<b>「水」の保全、整備</b>		
	・農業用水水利施設10地区の整備を行い、3,200haの農地への農業用水の安定供給を維持する。	・農業用水水利施設10地区の整備を行い、3,260haの農地への農業用水の安定供給を維持した。	達成
	<b>「土」の保全、整備</b>		
	・農業生産基盤100haの整備を行い、優良農地を確保すると共に、担い手へ70haの農地を集積する。	・農業生産基盤 104.4haの整備を行い、優良農地を確保すると共に、担い手へ108.7haの農地を集積した。	達成
	・農道9.0kmの保全対策を行い、農地2,600haの通作及び集出荷条件を改善する。	・農道9.0kmの保全対策を行い、農地2,600haの通作及び集出荷条件を改善した。	達成
	<b>「里」の保全、整備</b>		
	・湛水被害防止の整備を行い、湛水被害が予想される37haの農地の保全を図る。	・湛水被害防止の整備を行い、湛水被害が予想される37haの農地の保全を図った。	達成
	・農業集落排水施設11箇所の改築事業に必要な調査を行い、実施計画を策定する。	・農業集落排水施設11箇所の改築事業に必要な調査を行い、実施計画を策定した。	達成
	・農業集落排水施設16地区32施設の劣化等の機能診断調査を行い、最適整備構想を策定する。	・農業集落排水施設16地区32施設の劣化等の機能診断調査を行い、最適整備構想を策定した。	達成
	・農業集落排水施設15箇所の一般整備及び機能強化を行い、23,000人の生活排水の安定処理を図る。	・農業集落排水施設13箇所の一般整備及び機能強化を行い、22,000人の生活排水の安定処理を図った。	2地区取りやめによる減。
	※関連する農業農村整備事業の実績も含む		
<b>対象事業</b>	別紙のとおり		
<b>全体事業費</b>	計画: 8, 203, 341千円	実績: 7, 132, 181千円	
<b>評 価</b>			
項 目	内 容	評 価	説 明
(1) 交付対象事業の進捗状況	計画した事業内容が完了したか。	○ 否	計画した事業内容について、交付対象期間内に概ね完了した。完了しなかった地区については、3期計画又は補助事業等により、継続して事業を実施する。
(2) 事業効果の発現状況	事業効果は発現したか。	○ 否	「食料の安定的な供給」と「多面的機能を維持・発揮する農業農村」の実現に向けて対象事業を実施したことにより、農業水利施設の長寿命化や生産性の向上等が図られ、事業効果が発現した。
(3) 成果目標の目標値の実現状況	定量的指標の目標値について達成できたか。	○ 否	定量的指標について、一部の項目を除いて計画以上の数値となり、目標を概ね達成することができた。なお、目標を達成できなかった項目については、3期計画又は補助事業等により、引き続き事業推進を図る。
(4) 今後の方針	今後も引き続き、「群馬県農業農村整備計画2020」に基づき、「豊かで成長し続ける安全安心な農業・農村づくり」を目指し、農山漁村地域整備交付金等を活用して農業農村整備事業を推進していく。		


## 農山漁村地域整備計画の対象事業

事業名	事業型		事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容 (工種及び数量)	工期 (下段実工期)	計画期間内の総事業費 (千円)	実績		費用対効果	備考
	事業型	事業箇所名 (地区名)						計画期間内の総事業費 (千円)	計画期間内の総事業費 (千円)		
水利施設整備	基幹水利施設保全型	坂東大堰	群馬県	前橋市、高崎市、伊勢崎市、玉村町	取水堰補修2箇所他	H28 ~ H31	701,400	(コスト縮減) 691,400	1.25	水	
水利施設整備	基幹水利施設保全型	大正用水2期	群馬県	前橋市、伊勢崎市	水路補修0.24km	H28 ~ H31	186,850	(補助へ移行) 150,000	1.39	水	
水利施設整備	基幹水利施設保全型	赤谷川沿岸2期	群馬県	みなかみ町	実施設計 水路工0.12km	H28 ~ H29	99,200	99,200		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	水
水利施設整備	基幹水利施設保全型	赤城大沼用水2期	群馬県	前橋市	水路補修0.80km	H28 ~ H29	45,000	45,000		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	水
水利施設整備	基幹水利施設保全型	美野原	群馬県	中之条町	取水堰 水路補修0.68km	H28 ~ H29	36,400	36,400		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	水
水利施設整備	基幹水利施設保全型	長野堰頭首工	群馬県	高崎市	取水堰補修	H28 ~ H29	62,000	62,000		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	水
水利施設整備	基幹水利施設保全型	利根加用水	群馬県	千代田町	水管理制御施設	H28 ~ H30	81,000	81,000		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	水
水利施設整備	地域農業水利施設保全型	赤城西麓2	赤城西麓土地改良区	昭和村	管路補修0.49km	H29 ~ H30	16,500	16,500		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	水
水利施設整備	地域農業水利施設保全型	安中大堰	安中市	安中市	水路補修0.07km	H29	30,000	30,000		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	水
水利施設整備	歴史的施設保全事業	小幡	群馬県	甘楽町	水路補修0.6km	H28 ~ H31	120,000	120,000		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	水
水利施設整備	地域用水環境整備事業	赤城大沼	赤城大沼用水土地改良区	前橋市	実施設計 小水力発電施設	H28 ~ H29	102,000	102,000		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	水
水利施設整備	地域用水環境整備事業	大間々用水	大間々用水土地改良区	みどり市	実施設計 小水力発電施設	H28	81,420	81,420		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	水
水利施設整備	地域用水環境整備事業	矢場	待矢場両堰土地改良区	太田市、桐生市、館林市、邑楽町、大泉町、千代田町、足利市(栃木県)	実施設計 小水力発電施設	H28 ~ H29	206,000	206,000		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	水
農地防災	ため池等整備事業(用排水施設整備工事)	大間々用水	群馬県	みどり市、桐生市、伊勢崎市	隧道補修一式	H28 ~ H31	330,580	330,580	1.20		水
水利施設整備	畑地帯担い手育成型	境小此木	群馬県	伊勢崎市	区画整理6.1ha	H28 ~ H30	131,940	131,940	1.14		土
水利施設整備	畑地帯担い手育成型	松義中部	群馬県	安中市、富岡市	補完工	H28 ~ H29	152,436	152,436	1.07		土
水利施設整備	畑地帯担い手育成型	松義西部	群馬県	安中市、富岡市	区画整理19.4ha	H28 ~ H31	583,000	583,000	1.20		土
水利施設整備	畑地帯担い手育成型	上細井中西部	群馬県	前橋市	区画整理28.2ha	H28 ~ H31	664,210	(3期で実施) 644,210	1.68		土
水利施設整備	畑地帯担い手育成型	松義中部	松義台地土地改良区	安中市、富岡市	農業経営高度化支援事業(調査・調整事業)	H28 ~ H29	388	388		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	土
水利施設整備	畑地帯担い手育成型	松義中部	松義台地土地改良区	安中市、富岡市	農業経営高度化支援事業(中心経営体農地集積促進事業)	H31	62,800	62,800		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	土
農地整備	経営体育成型	下戸塚	群馬県	藤岡市	補完工	H28 ~ H31	60,900	(補助へ移行) 11,000	1.16		土
農地整備	経営体育成型	笹川沿岸	群馬県	藤岡市	区画整理0.4ha	H28 ~ H31	120,000	(補助へ移行) 20,000	1.44		土
農地整備	経営体育成型	五箇谷	群馬県	板倉町	区画整理36.6ha	H28 ~ H31	300,000	(補助へ移行) 100,000	1.74		土
農地整備	経営体育成型	牛田川除	群馬県	藤岡市	区画整理7.6ha	H28 ~ H31	256,500	(補助へ移行) 56,500	1.79		土
農地整備	経営体育成型	五箇谷	板倉町	板倉町	農業経営高度化支援事業(調査・調整事業)	H28 ~ H31	600	600		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	土
農地整備	耕作放棄地型	萩生川西	群馬県	東吾妻町	補完工	H28 ~ H29	119,896	119,896	1.11		土
農地整備	耕作放棄地型	萩生川西	東吾妻町	東吾妻町	農業経営高度化支援事業(耕作放棄地解消支援(調査・調整事業))	H28 ~ H31	200	200		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	土
農地整備	耕作放棄地型	萩生川西	東吾妻町	東吾妻町	農業経営高度化支援事業(耕作放棄地解消・集積促進事業)	H28 ~ H31	55,200	55,200		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	土

事業名	事業型		事業実施主体	関係市町村	計画期間内の の事業内容 (工種及び数量)	工期 (下段実工期)	計画期間内の の総事業費 (千円)	計画期間内の の総事業費 (千円) (増減理由)	費用対効果	備考		
	事業型	事業箇所名 (地区名)										
農村整備	農道整備事業(広域営農団地農道型)	榛名南麓2期	群馬県	高崎市	農道1.4km	H28 ~ H31	870,000	(3期で実施)825,000	1.06	土		
農地整備	通作条件整備(基幹農道保全対策型)	赤城南第2	群馬県	渋川市	保全対策1.2km	H28 ~ H31	253,390	253,390		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	土	
農地整備	通作条件整備(基幹農道保全対策型)	赤城西	群馬県	昭和村	保全対策1.8km	H28 ~ H31	254,606	254,606		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	土	
農地整備	通作条件整備(基幹農道保全対策型)	子持	群馬県	渋川市	保全対策0.7km	H28 ~ H29	24,610	24,610		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	土	
農地整備	通作条件整備(基幹農道保全対策型)	大笹	群馬県	嬬恋村	保全対策2.7km	H28 ~ H31	171,232	171,232		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	土	
効果促進	-	田代南	群馬県	嬬恋村	嬬恋村	獣害防止柵4.5km	H28	90,000	90,000		効果促進事業のため未記入	土
農地整備	通作条件整備(基幹農道保全対策型)	中之条	群馬県	中之条町	保全対策1.1km	H28 ~ H31	121,000	121,000		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	土	
農地整備	通作条件整備(基幹農道保全対策型)	榛名西麓1期	群馬県	東吾妻町	保全対策1.6km	H28 ~ H31	143,500	143,500		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	土	
農地整備	農業基盤整備促進事業(定率)	境下武士	境下武士 土地改良区	伊勢崎市	区画整理2.9ha	H28	50,000	50,000	1.23		土	
農地整備	農業基盤整備促進事業(定率)	宇田・一ノ宮	富岡市	富岡市	区画整理3.2ha	H28 ~ H29	53,800	53,800	1.29		土	
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業(集落基盤再編型)	大久保	群馬県	太田市	被害解消面積37ha	H28 ~ H31	467,672	467,672	1.56		里	
農村整備	農業集落排水事業(整備又は改築のための調査及び計画の策定)	込皆戸	前橋市	前橋市	調査計画	H28 ~ H29	7,280	7,280		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里	
農村整備	農業集落排水事業(整備又は改築のための調査及び計画の策定)	浜川	高崎市	高崎市	調査計画	H28	7,500	7,500		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里	
農村整備	農業集落排水事業(整備又は改築のための調査及び計画の策定)	二ノ宮	前橋市	前橋市	調査計画	H29 ~ H30	8,890	8,890		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里	
農村整備	農業集落排水事業(整備又は改築のための調査及び計画の策定)	富岡	高崎市	高崎市	調査計画	H29 ~ H30	8,000	8,000		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里	
農村整備	農業集落排水事業(整備又は改築のための調査及び計画の策定)	天引	甘楽町	甘楽町	調査計画	H29	8,000	8,000		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里	
農村整備	農業集落排水事業(整備又は改築のための調査及び計画の策定)	前橋東部	前橋市	前橋市	調査計画	H30	6,260	6,260		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里	
農村整備	農業集落排水事業(整備又は改築のための調査及び計画の策定)	樋越	前橋市	前橋市	調査設計	H31	6,000	6,000		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里	
農村整備	農業集落排水事業(整備又は改築のための調査及び計画の策定)	長岡	榛東村	榛東村	調査設計	H31	5,000	5,000		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里	
農村整備	農業集落排水事業(整備又は改築のための調査及び計画の策定)	中之条	中之条町	中之条町	調査設計	H31	3,300	3,300		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里	
農村整備	農業集落排水事業(整備又は改築のための調査及び計画の策定)	新田	長野原町	長野原町	調査設計	H31	5,000	5,000		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里	
農村整備	農業集落排水事業(整備又は改築のための調査及び計画の策定)	市野井・市	太田市	太田市	調査設計	H31	2,500	2,500		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里	
農村整備	農業集落排水事業(機能診断調査及び最適整備構想の策定)	前橋	前橋市	前橋市	2施設診断調査、構想策定	H28 ~ H29	12,000	12,000		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里	
農村整備	農業集落排水事業(機能診断調査及び最適整備構想の策定)	沼田	沼田市	沼田市	3施設診断調査、構想策定	H28	14,000	14,000		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里	
農村整備	農業集落排水事業(機能診断調査及び最適整備構想の策定)	中之条	中之条町	中之条町	2施設診断調査、構想策定	H28	10,000	10,000		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里	
農村整備	農業集落排水事業(機能診断調査及び最適整備構想の策定)	館林	館林市	館林市	1施設診断調査、構想策定	H28	4,500	4,500		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里	
農村整備	農業集落排水事業(機能診断調査及び最適整備構想の策定)	みどり	みどり市	みどり市	1施設診断調査、構想策定	H28 ~ H29	4,536	4,536		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里	
農村整備	農業集落排水事業(機能診断調査及び最適整備構想の策定)	榛東	榛東村	榛東村	1施設診断調査、構想策定	H28	3,220	3,220		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里	
農村整備	農業集落排水事業(機能診断調査及び最適整備構想の策定)	吉岡	吉岡町	吉岡町	3施設診断調査、構想策定	H28	10,500	10,500		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里	
農村整備	農業集落排水事業(機能診断調査及び最適整備構想の策定)	嬬恋	嬬恋村	嬬恋村	3施設診断調査、構想策定	H29	9,750	9,750		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里	

事業名	事業型		事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容 (工種及び数量)	工期 (下段実工期)	計画期間内の総事業費 (千円)	計画期間内の総事業費 (千円) (増減理由)	費用対効果	備考
	事業型	事業箇所名 (地区名)								
農村整備	農業集落排水事業(機能診断調査及び最適整備構想の策定)	片品	片品村	片品村	2 施設診断調査、構想策定	H29 ~ H30	6,500	6,500	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里
農村整備	農業集落排水事業(機能診断調査及び最適整備構想の策定)	みなかみ	みなかみ町	みなかみ町	1 施設診断調査、構想策定	H29	3,300	3,300	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里
農村整備	農業集落排水事業(機能診断調査及び最適整備構想の策定)	岡本	富岡市	富岡市	1 施設診断調査、構想策定	H30	4,000	4,000	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里
農村整備	農業集落排水事業(機能診断調査及び最適整備構想の策定)	甘楽	甘楽町	甘楽町	3 施設診断調査、構想策定	H30 ~ H31	11,000	11,000	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里
農村整備	農業集落排水事業(機能診断調査及び最適整備構想の策定)	長野原	長野原町	長野原町	3 施設診断調査、構想策定	H30	11,000	11,000	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里
農村整備	農業集落排水事業(機能診断調査及び最適整備構想の策定)	高山	高山村	高山村	2 施設診断調査、構想策定	H30	7,300	7,300	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里
農村整備	農業集落排水事業(機能診断調査及び最適整備構想の策定)	東吾妻	東吾妻町	東吾妻町	3 施設診断調査、構想策定	H30	9,600	9,600	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里
農村整備	農業集落排水事業(機能診断調査及び最適整備構想の策定)	榛東2	榛東村	榛東村	1 施設診断調査、構想策定	H31	4,475	4,475	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	里
農村整備	農業集落排水事業(農業集落排水施設等の整備又は改築)	下増田	前橋市	前橋市	管路補修工一式	H28	48,840	48,840	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	里
農村整備	農業集落排水事業(農業集落排水施設等の整備又は改築)	石井	前橋市	前橋市	処理場型式変更	H28 ~ H29	36,230	36,230	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	里
農村整備	農業集落排水事業(農業集落排水施設等の整備又は改築)	奈良・尾合	沼田市	沼田市	処理場型式変更 管路補修工一式	H28	5,000	5,000	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	里
農村整備	農業集落排水事業(農業集落排水施設等の整備又は改築)	昭和	昭和村	昭和村	管路補修工一式 遠隔監視装置一式	H28	19,580	19,580	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	里
農村整備	農業集落排水事業(農業集落排水施設等の整備又は改築)	片品	片品村	片品村	資源循環施設一式	H28 ~ H31	360,000	0	他事業で実施 H28年度以前に着手した地区であるため未記入	里
農村整備	農業集落排水事業(農業集落排水施設等の整備又は改築)	上増田	前橋市	前橋市	管路補修工一式 処理施設補修工一式 污泥脱水機更新	H28 ~ H31	90,000	86,640	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	里
農村整備	農業集落排水事業(農業集落排水施設等の整備又は改築)	新屋	前橋市	前橋市	処理施設補修工一式 污泥脱水機新設	H28 ~ H30	130,340	130,340	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	里
農村整備	農業集落排水事業(農業集落排水施設等の整備又は改築)	城南上野	甘楽町	甘楽町	処理施設改修工一式 管路補修工一式	H28 ~ H30	38,080	38,080	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	里
農村整備	農業集落排水事業(農業集落排水施設等の整備又は改築)	浜川	高崎市	高崎市	管路補修工一式	H29 ~ H30	14,000	14,000	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	里
農村整備	農業集落排水事業(農業集落排水施設等の整備又は改築)	込皆戸	前橋市	前橋市	太陽光発電施設 処理施設補修工一式 污泥脱水機更新	H30 ~ H31	66,400	49,900	1.32	里
農村整備	農業集落排水事業(農業集落排水施設等の整備又は改築)	天引	甘楽町	甘楽町	処理施設改修工一式 管路補修工一式	H30 ~ H31	24,300	12,820	1.05	里
農村整備	農業集落排水事業(農業集落排水施設等の整備又は改築)	二之宮	前橋市	前橋市	実施設計	H31	10,000	6,930	1.34	里
農村整備	農業集落排水事業(農業集落排水施設等の整備又は改築)	前橋東部	前橋市	前橋市	実施設計 管路補修工一式	H31	32,930	32,930	1.09	里
農村整備	農業集落排水事業(農業集落排水施設等の整備又は改築)	富岡	高崎市	高崎市	管路補修工一式	H31	15,000	0	(とりやめ) 1.08	里
農村整備	農業集落排水事業(農業集落排水施設等の整備又は改築)	糸井・三ツ谷	昭和村	昭和村	実施設計	H31	13,000	13,000	1.10	里
合計 (全体事業費)							8,203,341	7,132,181		

# 群馬県農山漁村地域整備計画対象地区位置図

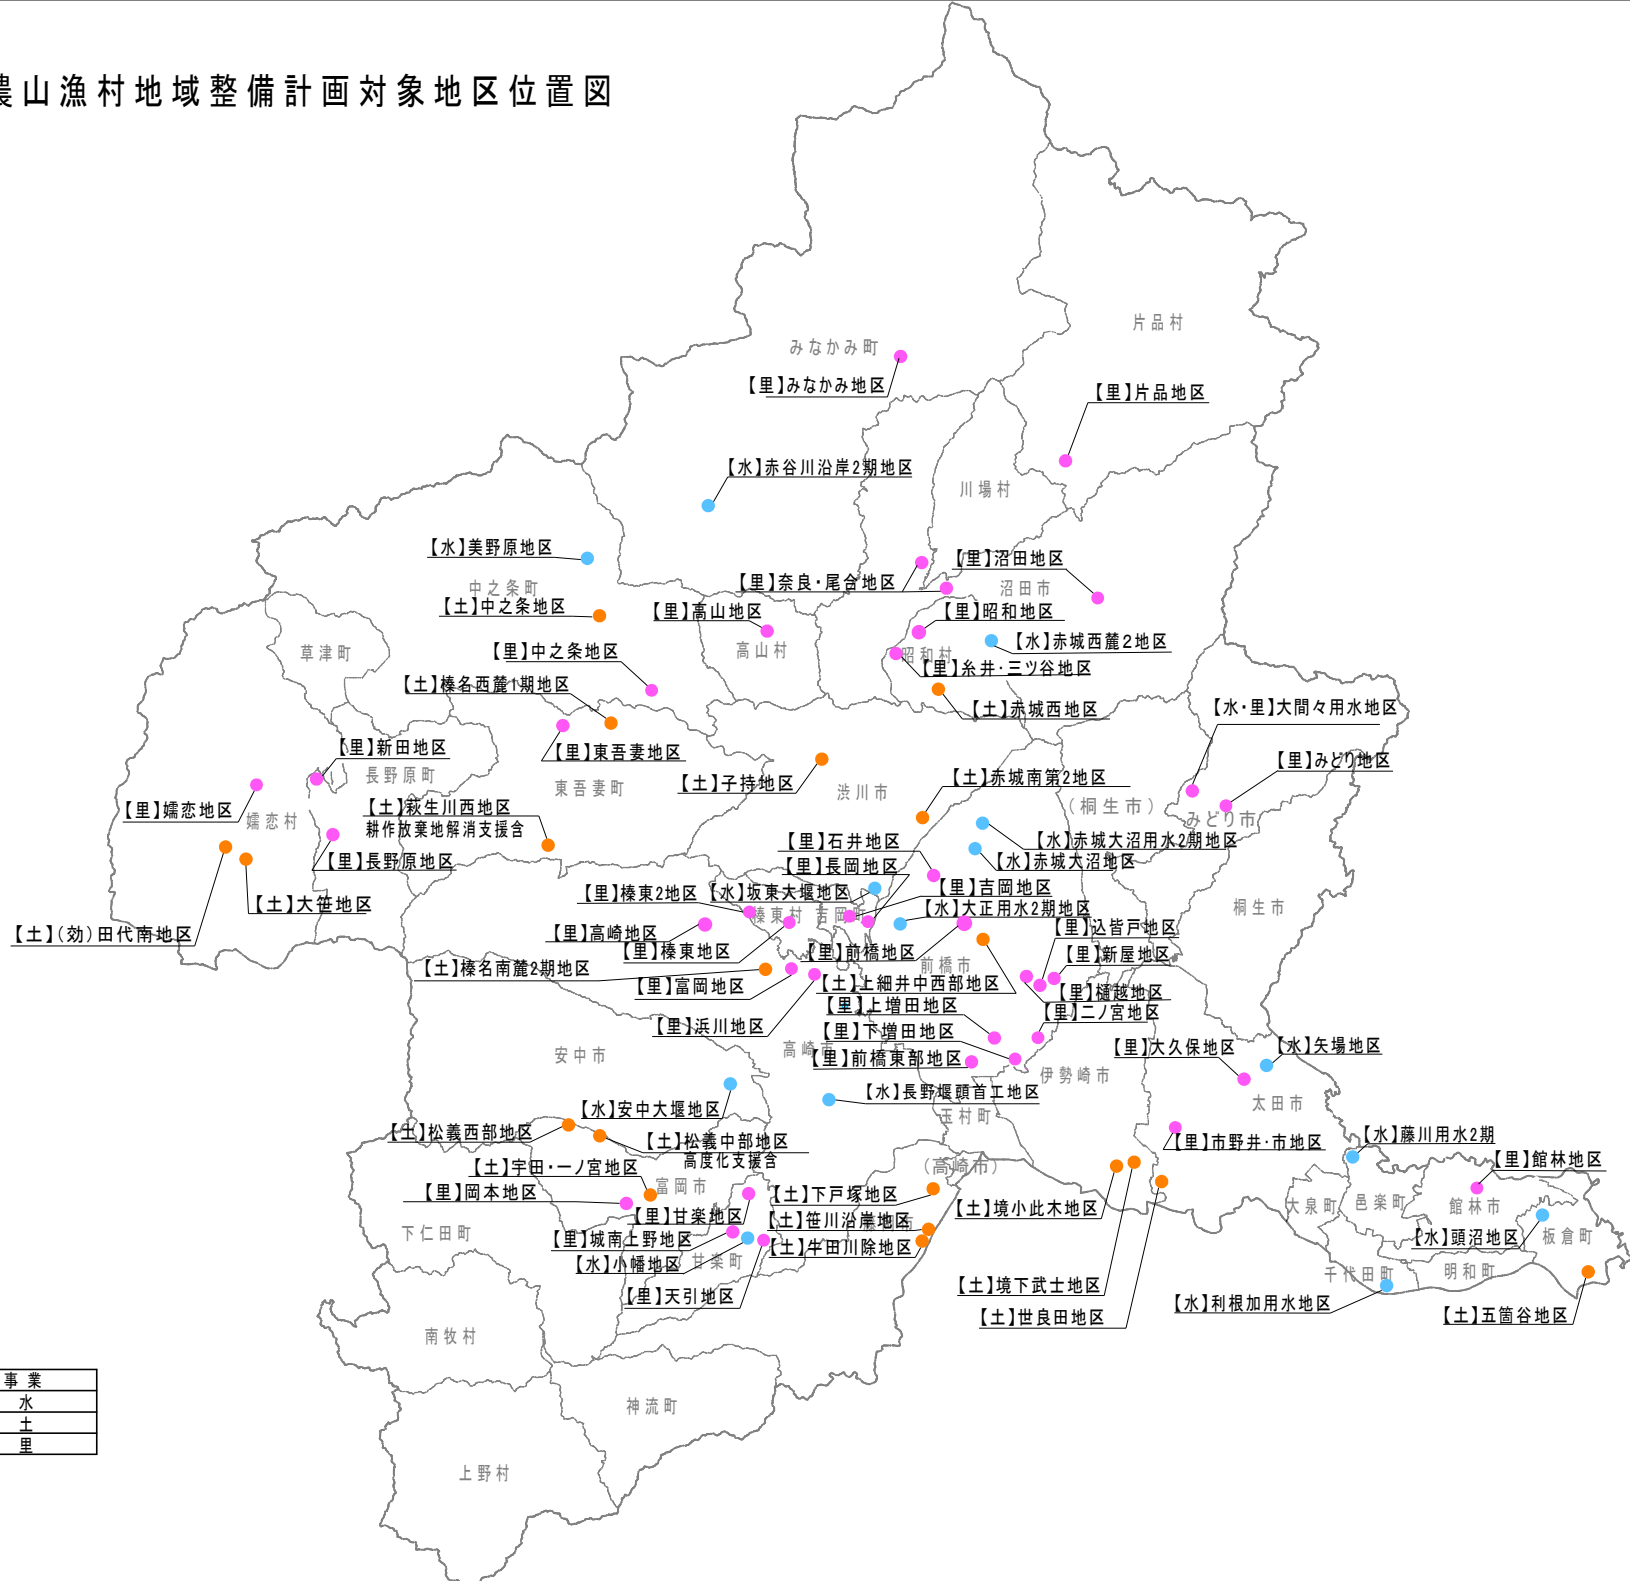

交付金事業	
● (Blue)	水
● (Orange)	土
● (Pink)	里
