

令和4年度群馬県建設工事施工者表彰(知事表彰)の受賞者一覧

No.1

(環境森林部) 【資料1】



施工業者 石坂建設(株)
代表取締役 諸田 光二

工事名 令和02年度(ゼロ国債)
復旧治山事業

工事場所 利根郡昭和村大字川額(清水沢) 地内

工期 令和3年3月31日 ~ 令和4年1月20日

請負額 金52,085,000円

主任技術者 茂野 義則

現地審査
でのポイント

- ・床固工の天端コンクリートにクラックがなくきれいであった。
- ・ブロック積みの目地間隔が均一で揃っていた。
- ・ブロック積みのとおりが良好であった。

No.2

(環境森林部)



施工業者 小坂建設(株)
代表取締役 小坂 哲平

工事名 令和03年度
予防治山事業

工事場所 利根郡川場村大字
川場湯原(木賊) 地内

工期 令和3年7月15日 ~ 令和3年12月20日

請負額 金38,335,000円

主任技術者 水出 修

現地審査
でのポイント

- ・谷止工の天端コンクリートにクラックがなくきれいであった。
- ・谷止工コンクリートに型枠の目違いがなくきれいであった。

No.3

(環境森林部)



施工業者 (株)新井土木
代表取締役 新井 正則

工事名 令和02年度(ゼロ国債)
復旧治山事業

工事場所 桐生市黒保根町上田沢(南平久保) 地内

工期 令和3年3月29日 ~ 令和4年3月20日

請負額 金49,841,000円

主任技術者 大塚 孝二

現地審査
でのポイント

- ・コンクリート面にあばた、クラックがなくきれいであった。(No.1谷止工)
- ・構造物のとおりが良好であった。(No.2谷止工)
- ・天端コンクリートにクラックがなくきれいであった。(No.2谷止工)
- ・植生の状態が均一で活着が良好であった。(No.2谷止工)

令和4年度群馬県建設工事施工者表彰(知事表彰)の受賞者一覧

No.4

(環境森林部) 【資料2】



施工業者 東興ジオテック(株) 群馬営業所
 所長 北爪 聡
工事名 令和02年度 県単修繕事業
 (補助公共治山施設)
工事場所 みどり市東町座間(柱戸南) 地内
工期 令和3年3月29日 ~ 令和3年10月20日
請負額 金34,980,000円
主任技術者 渡邊 哲
現地審査でのポイント

- ・法枠工が法面の形状に沿って丁寧に施工されていることが確認できた。
- ・法枠にクラックがなくきれいであった。
- ・枠内の植生活着状態が良好であった。

No.5

(県土整備部)




施工業者 田子林業(株)
 代表取締役 田子 元幹
工事名 社会資本総合整備(防災・安全)
 (火山砂防)(重点)(3ヶ年)
 (分割2号)
路河川名 利根川支川 千石沢3
工事場所 渋川市赤城町津久田 地先
工期 令和2年12月15日 ~ 令和3年11月19日
請負額 金56,343,000円
主任技術者 田中 久土
現地審査でのポイント

- ・堤体コンクリートにあばた、クラックがなくきれいであった。
- ・堤体コンクリートに型枠の目違いがなくきれいであった。

No.6

(県土整備部)

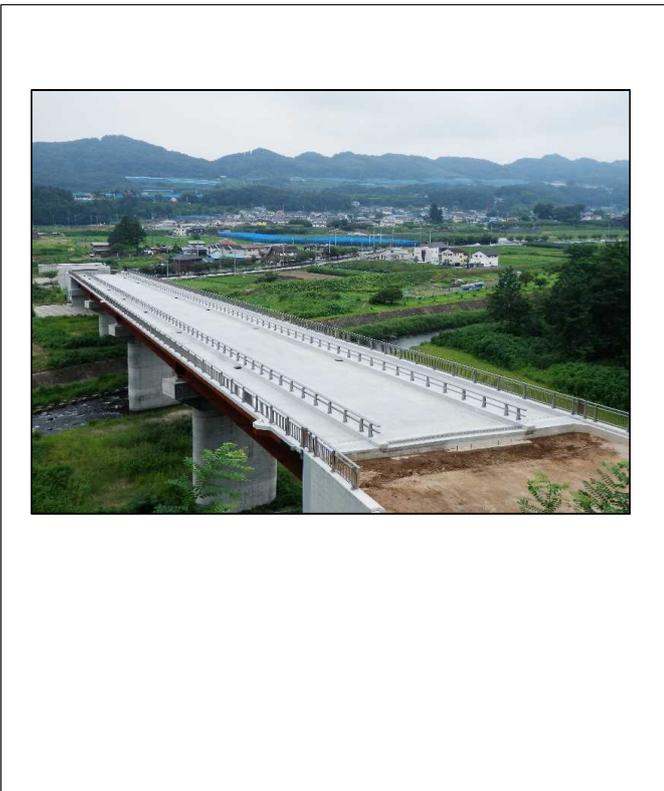

施工業者 高田機工(株)東京本社
 営業本部東部営業部長 前田 豊
工事名 社会資本総合整備(活力 重点)(分割15号)
 (仮称)烏川橋梁上部工 製作架設工事
路河川名 主要地方道
 前橋安中富岡線
 西毛広域幹線道路
 (高崎西工区)
工事場所 高崎市本郷町 外地内
工期 令和元年10月9日 ~ 令和3年7月30日
請負額 金685,190,000円
監理技術者 大江 孝多郎
現地審査でのポイント

- 【主桁】
 - ・とおりが良好であった。
 - ・鋼材の保護層となる安定錆が一様に発生していることが確認できた。
- 【歩車道境界コンクリート】
 - ・とおりが良好で、あばた、クラックがなくきれいであった。
- 【床版】
 - ・平坦性が良好であった。
- 【伸縮装置工】
 - ・コンクリート面と伸縮装置との段差がなく丁寧な施工であった。

令和4年度群馬県建設工事施工者表彰(知事表彰)の受賞者一覧

No.7

(県土整備部) 【資料3】



施工業者 高橋建設(株)
 代表取締役社長 高橋 鎮男
工事名 社会資本総合整備(防災・安全)(急傾斜)
 分割2号
 簡易吹付法枠設置工事
路河川名 宅地
 急傾斜地崩壊危険区域
工事場所 高崎市箕郷町松之沢 地先
工期 令和2年11月28日 ~ 令和3年7月28日
請負額 金43,560,000円
主任技術者 小池 智和
現地審査でのポイント
 ・モルタル吹付面にクラックがなくきれいであった。
 ・吹付端部の地山への擦り付けが良好であった。
 ・水抜パイプの仕上面、切り揃えが良好であった。

No.8

(県土整備部)



施工業者 高橋建設(株)
 代表取締役社長 高橋 鎮男
工事名 社会資本総合整備
 (活力・重点) 分割140号
 (No.0~No.25付近 舗装工)
路河川名 主要地方道
 前橋安中富岡線
 西毛広幹道
 (高崎西工区)
工事場所 高崎市箕郷町下芝 外地内
工期 令和3年7月8日 ~ 令和4年1月31日
請負額 金69,058,000円
監理技術者 野口 正喜
現地審査でのポイント
 ・舗装ジョイントに開きがなく、段差もなかった。
 ・舗装と構造物の擦り付けが良好であった。
 ・舗装の平坦性が良好であった。
 ・粒度が均一に仕上がっていた。

No.9

(県土整備部)



施工業者 安中土建(株)
 代表取締役 大澤 卓朗
工事名 社会資本総合整備(活力・重点)
 本線舗装工事
 分割4号
 一般県道
路河川名 下里見安中線
 西毛広域幹線道路
 (安中工区)
工事場所 安中市安中 地内
工期 令和3年2月1日 ~ 令和3年6月30日
請負額 金42,867,000円
主任技術者 石井 亘
現地審査でのポイント
 ・(2車線同時施工により)センタージョイントをなくす工夫をした。
 ・舗装の平坦性が良好であった。
 ・粒度が均一に仕上がっていた。

令和4年度群馬県建設工事施工者表彰(知事表彰)の受賞者一覧

No.10

(県土整備部) 【資料4】



施工業者 川田工業(株) 群馬営業所
 所長 池田 守
工事名 社会資本総合整備
 (広域・新潟長野)
 立処橋上部工製作架設工事
路河川名 国道299号
工事場所 多野郡神流町大字神ヶ原 地内
 古鉄橋上流工区
工期 令和元年12月16日 ~ 令和3年5月31日
請負額 金446,325,000円
監理技術者 羽田 明
現地審査でのポイント
 ・桁の曲線の線形が良好でとおりが良かった。
 ・桁端部における細部の塗装がムラなく仕上がっており、丁寧に施工されていることが確認できた。

No.11

(県土整備部)



施工業者 東光建設(株)
 代表取締役 竹内 猶則
工事名 河川災害復旧
 令和元年災
 第628号
路河川名 一級河川
 吾妻川 左岸
工事場所 吾妻郡長野原町大字羽根尾 地先
 浜岩橋の下流
工期 令和2年8月31日 ~ 令和3年8月31日
請負額 金115,753,000円
監理技術者 綿貫 博之
現地審査でのポイント
 ・護岸工、根固めブロックのとおりが良好であった。
 ・天端コンクリートにクラックがなくきれいであった。
 ・隔壁コンクリートにあばた、クラックがなくきれいであった。

No.12

(県土整備部)



施工業者 渡辺建設(株)
 代表取締役 渡辺 栄志
 社会資本総合整備(広域・長野)
工事名 (分割2号)
 R01線越
路河川名 国道144号 大前工区
工事場所 吾妻郡嬭恋村大字大前 地内
工期 令和2年8月19日 ~ 令和3年8月31日
請負額 金75,735,000円
主任技術者 関 雄司
現地審査でのポイント
 ・補強土壁のとおりが良好であった。
 ・壁面材の目地間隔が均一であった。
 ・笠コンクリートにあばた、クラックがなくきれいであった。

令和4年度群馬県建設工事施工者表彰(知事表彰)の受賞者一覧

No.13

(県土整備部) 【資料5】



施工業者 (株)千島工務店
 代表取締役社長 今泉 弘行
 工事名 道路改築事業
 (地方道・連携)
 龍ヶ鼻橋 下部工(P2橋脚)
 路河川名 一般県道
 植栗伊勢線
 工事場所 吾妻郡中之条町大字伊勢町 地内
 工期 令和2年11月6日 ~ 令和3年12月28日
 請負額 金134,299,000円
 監理技術者 小野 嘉一
 現地審査
 でのポイント
 ・橋脚のとおりが良好であった。
 ・型枠のズレがなくきれいであった。
 ・コンクリート面にあばた、クラックがなくきれいであった。

No.14

(県土整備部)



施工業者 萬屋建設(株)
 代表取締役 須田 恭弘
 工事名 事業間連携砂防等事業
 (急傾斜)
 路河川名 高戸谷(老神1)
 急傾斜地崩壊危険区域
 工事場所 沼田市利根町高戸谷 地内
 工期 令和2年9月23日 ~ 令和3年10月28日
 請負額 金76,758,000円
 監理技術者 倉品 康弘
 現地審査
 でのポイント
 ・補強土擁壁工のとおりが良好であった。
 ・落石防護網のとおりが良好で、番線処理が丁寧であった。

No.15

(県土整備部)



施工業者 荒井建設(株)
 代表取締役 石倉 利昭
 工事名 社会資本総合整備
 (防災・安全社会資本整備交付金)(3か年)
 分割1号 A2橋台
 路河川名 一級河川
 新堀川導水路 入ヶ谷橋
 工事場所 邑楽郡明和町入ヶ谷 地先
 工期 令和3年7月31日 ~ 令和4年3月28日
 請負額 金62,812,900円
 監理技術者 加藤 正昭
 現地審査
 でのポイント
 ・橋台のとおりが良好であった。
 ・コンクリート面にあばた、クラックがなくきれいであった。
 ・鉄筋が等間隔で配置され、防錆処理が丁寧であった。

令和4年度群馬県建設工事施工者表彰(知事表彰)の受賞者一覧

No.16

(県土整備部) 【資料6】



施工業者 池原工業(株)
 代表取締役 池原 純
 工事名 道路改築事業
 (国道・連携)
 (仮称)万木沢1号函渠工工事
 国道145号
 路河川名 上信自動車道
 吾妻西バイパス
 工事場所 吾妻郡東吾妻町大字三島 地内
 工期 令和3年3月16日 ~ 令和4年3月25日
 請負額 金238,764,600円
 監理技術者 吉原 亮太

現地審査
 でのポイント

- ・コンクリート面にあばた、クラックがなくきれいであった。
- ・ブロック積みのおりが良好であった。

No.17

(企業局)



施工業者 (株)明電舎 群馬支店
 支店長 戸田 顕志
 工事名 ハツ場発電所
 機器製作据付工事
 路河川名 吾妻発電事務所
 工事場所 吾妻郡長野原町大字川原畑 外地内
 工期 平成28年5月20日 ~ 令和3年6月30日
 請負額 金1,867,325,000円
 監理技術者 齋藤 淳

現地審査
 でのポイント

- ・水車、発電機の製作精度が良好であった。
- ・発電機の両側に水車を配置する際の芯出しなど、据付け精度が良好であった。
- ・軸受け架台を鋼製とし、コンクリート打設と並行して機器据付けを行う提案により、工期短縮を図った。
- ・吸出し管が滑らかに溶接され、水車からの水をスムーズに排出できる。
